

INVESTITIONSBERICHT ZUM 07.05.2021

ORTSMITTE ÖTLINGEN – KREUZUNG RATHAUS ÖTLINGEN BIS ZU WIELANDSTRAÙE



- Anlass** Aufwertung Ortsmitte Ötlingen
Sanierungsgebiet mit Förderung
- Zielsetzung** Sanierung und Ertüchtigung der alten Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der Straße inkl. Platzgestaltung der Bereiche Laterale und Silberne Rose (jeweils südlich der Stuttgarter Straße) sowie Verlegung von Breitband
- Projektleitung** Matthias Eisenschmid (SG Tiefbau und Beiträge)
- Projektlaufzeit** Bauabschnitt BA2B, Abschluss Ende Mai 2022

Aktueller Stand

Vergabe und Beauftragung Tief- und Straßenbau an die Fa. Wagershauser ist erfolgt, Baubeginn BA2B in KW 21

Nächster Schritt Gemeinderat


Die Maßnahme wird in der Verwaltung abgewickelt und der Gemeinderat über diesen Bericht regelmäßig über den Stand der Maßnahme informiert.

Handlungsbedarf

Kein Handlungsbedarf

Ablauf

ANFANG	07.06.2021	2021										2022					
ENDE	31.05.2022																
PSP	NAME	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun		
1																	
1.1.1	Bereich Laterale	◆															
1.1.2	Bereich Apotheke					◆	◆										
1.1.3	Bereich Silberne Rose					◆	◆										
1.1.4	Bereich Stuttgarter Straße							◆									
1.1.5	Bereich Kreissparkasse												◆				
1.1.6	Baumaßnahmen fertiggestellt														◆		

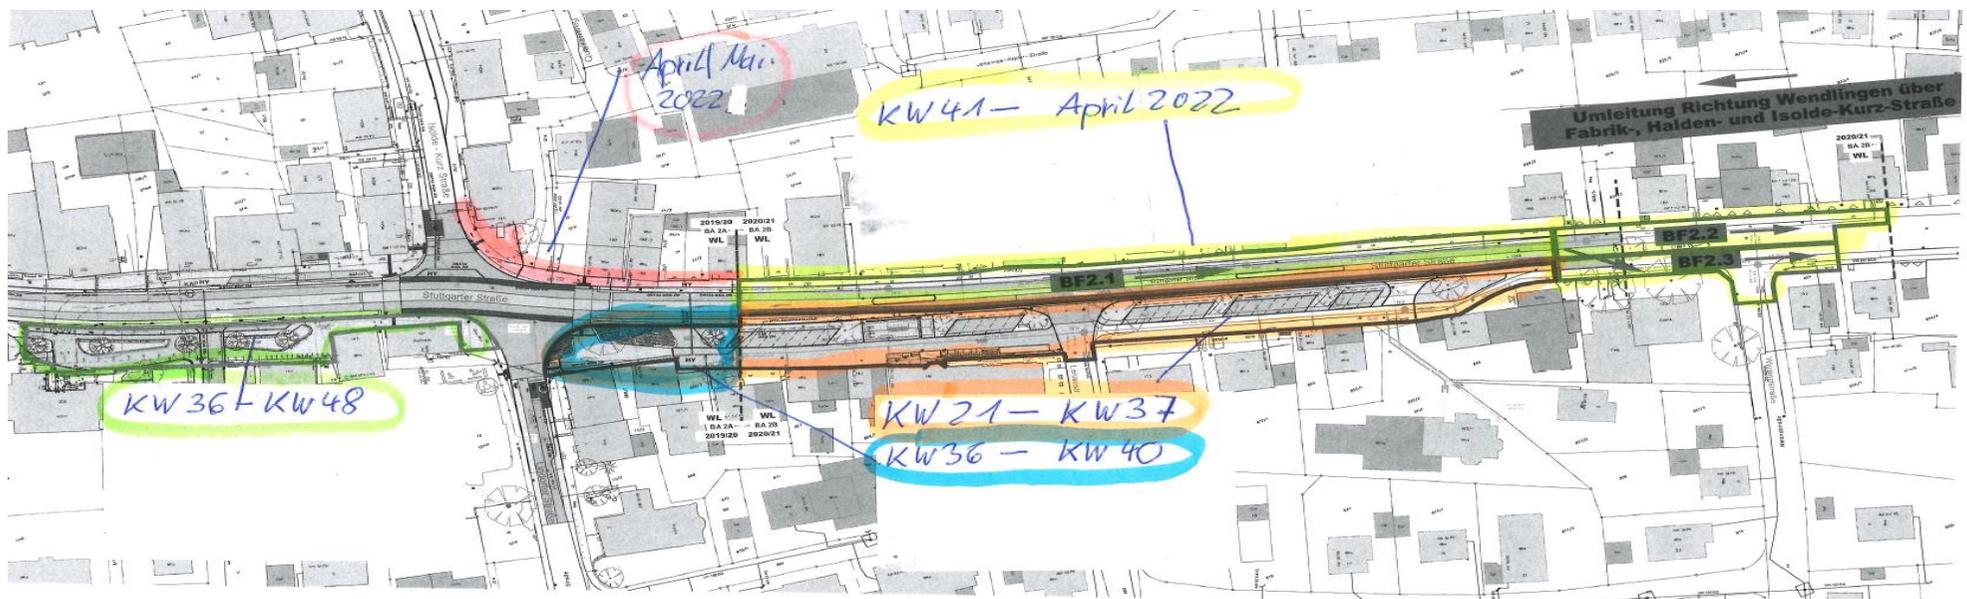

Gesamtkosten

