


# Anlage 11 zur Sitzungsvorlage IWU/2020/032 (ö)

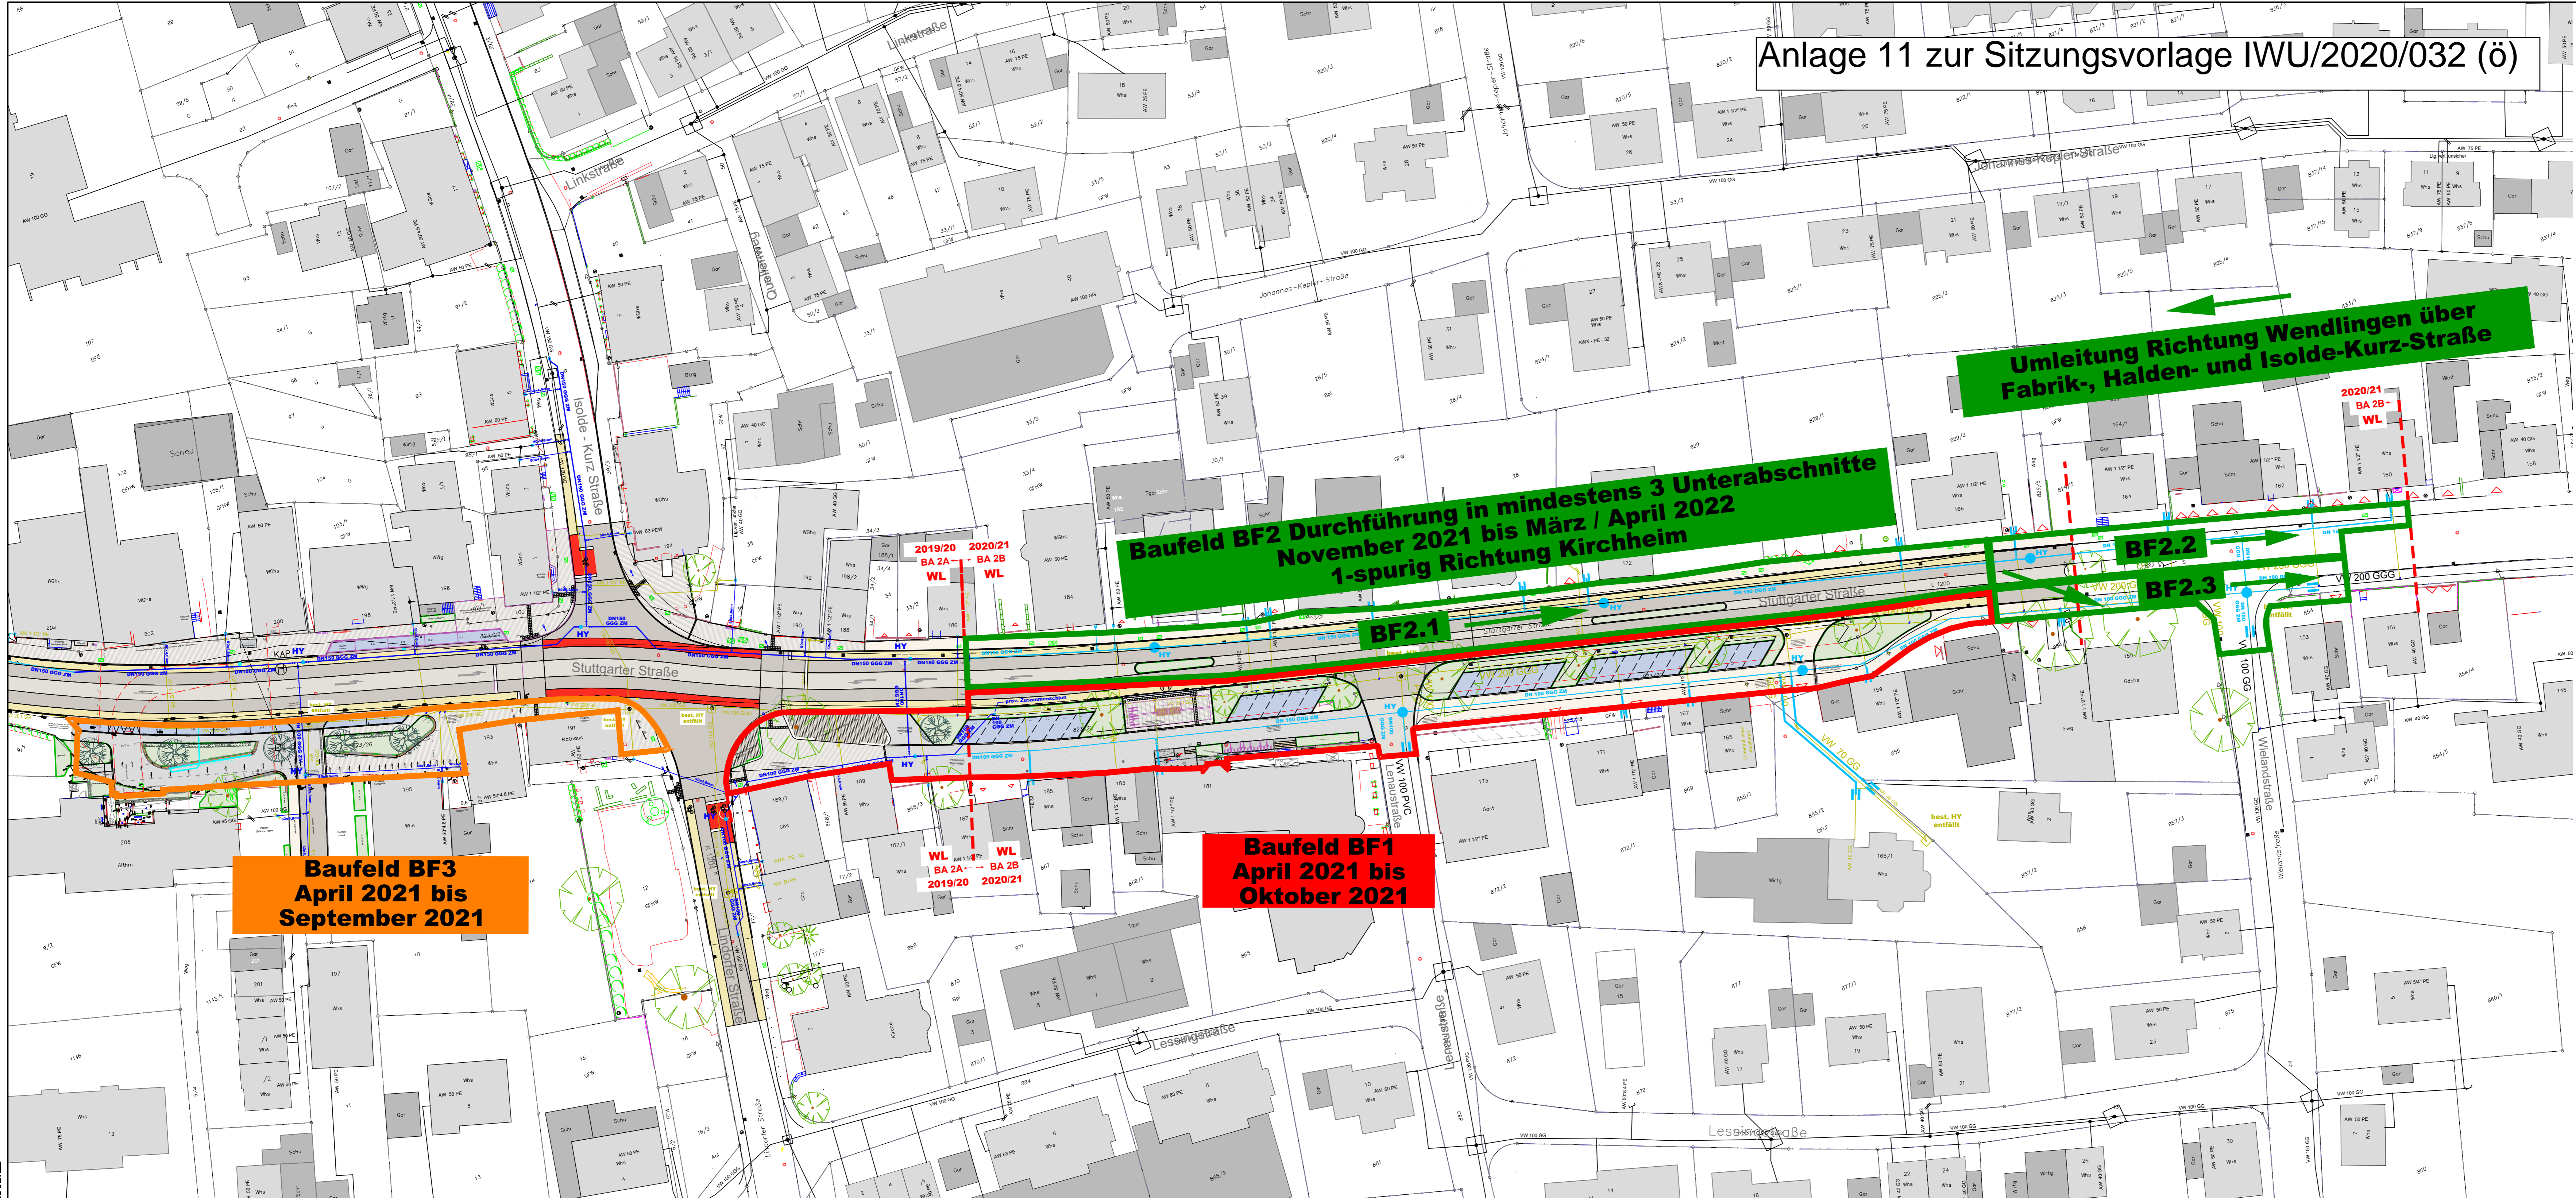

**Baufeld BF3**  
April 2021 bis  
September 2021

**Baufeld BF1**  
April 2021 bis  
Oktober 2021

**Baufeld BF2 Durchführung in mindestens 3 Unterabschnitten**  
November 2021 bis März / April 2022  
1-spurig Richtung Kirchheim

**Umleitung Richtung Wendlingen über Fabrik-, Halden- und Isolden-Kurz-Straße**

## Geplanter Bauablauf / geplante Baufelder:

**BA2B BF 1:**  
Südliche Straßenseite Stuttgarter Straße L 1200 und Bereich Laterie zwischen Parkplätze und Gebäude Stuttgarter Straße 189 und 159  
Neuerlegung Wasser-, Gas-, Kabel (Dt. Telekom, Netze BW, Straßenbeleuchtung, Leerrohre Stadt), Kanalsanierung Straßenbau Fahrbahn, Gehwege, Parkplätze, Bushaltestelle u. a. Umbau Zugang Einkaufsmarkt Baudurchführung in ca. 2-3 Unterabschnitten  
**(Bauzeit stark witterungsabhängig!)**

Verkehrsführung Stuttgarter Straße 2-spurig ohne Umleitung, Abbiegespur Richtung Lindorf aus Kirchheim kommend gesperrt. Umleitung über Stuttgarter Straße in Richtung Kreisverkehr Hermann-Kurz-Straße, komplett wenden und über Stuttgarter Straße – Lindorfer Straße in Richtung Lindorf fahren.

Bauzeit voraussichtlich April 2021 bis Oktober 2021

**BA 2B BF 2:**  
Nördliche Straßenseite Stuttgarter Straße L 1200 zwischen Gebäude Stuttgarter Straße 186 und 160 und Einmündungsbereich Stuttgarter-/Wielandstraße

Neuerlegung Wasser-, Gas-, Kabel (Dt. Telekom, Netze BW, Straßenbeleuchtung, Leerrohre Stadt), Kanalsanierung, Straßenbau Fahrbahn und Gehwege, u. a.

Verkehrsführung Stuttgarter Straße 1-spurig mit Umleitung in Richtung Wendlingen, Lindorf über die Fabrik-, Halden-, Isolden-Kurz-Straße und Richtung Notzingen über die Schönblückstraße.

Im Bereich der bestehenden Verkehrsinsel nördlich des Bürgerhauses bzw. Feuerwehrgebäudes Stuttgarter Straße 160 bis 166 muß die 1-spurige Verkehrsführung in mindestens 2 Unterabschnitten ausgeführt werden.

Der Bauablauf ist mit der Feuerwehr abzustimmen.

Bauzeit voraussichtlich November 2021 bis März / April 2022

**BA2A 1 BF 3:**  
Bereich Silberne Rose

Umgestaltung Platzbereich zwischen Gebäude Stuttgarter Straße 205 (Silberne Rose) und Rathaus Straßenbau- und Grünflächenarbeiten.  
Bauzeit April 2021 bis September 2021

Änderungsindex	Datum
infra-teck GmbH Kellerstraße 69 73265 Dettingen unter Teck Telefon 07021-9316720 Fax 07021-9316722 www.infra-teck.de	
Projekt <b>OMI Ötlingen</b>	
Planbezeichnung Lageplan - gepl. Bauablauf / Baufelder BA 2A_1 Bereich Silberne Rose BA 2B Kreuzung Stuttgarter Straße / Lindorfer Straße bis Wielandstraße	
Planungsstand Entwurf	
Maßstab: <b>1:500</b>	Plan: 107.1105.B45 Datum: 21.08.2020
Größe: 116 x 45	Gezeichnet: PH Geliefert: SP
Auftraggeber Stadt Kirchheim unter Teck Landkreis Esslingen	
Anerkannt der Bauherr Stadt Kirchheim unter Teck	
<small>Grundlage: ALK vom Vermessungsamt Baden-Württemberg (Stand 2012) in Abgleich mit NMS-Orten 2017 / Entwurf BA2B CAD-Daten + 13.170.2020/11 Versand des von Eulrich-Götsch, Wendlingen / Gebrauchshilfenstatus: 130 + NH-System / GK-Koordinaten Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterverwendung - AUCH NUR AUSZUGSWEISE - ist die infra-teck GmbH als Urheber zu vermerken.</small>	
