

INVESTITIONSBERICHTBERICHT ZUM 03.12.2021

ORTSMITTE ÖTLINGEN – KREUZUNG RATHAUS ÖTLINGEN BIS ZU WIELANDSTRAÙE (BA 2B)



Anlass	Aufwertung Ortsmitte Ötlingen Sanierungsgebiet mit Förderung
Zielsetzung	Sanierung und Ertüchtigung der alten Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der Straße inkl. Platzgestaltung der Bereiche Laterale und Silberne Rose(jeweils südlich der Stuttgarter Straße) sowie Verlegung von Breitband
Projektleitung	Matthias Eisenschmid (SG Tiefbau und Beiträge)
Projektlaufzeit	Bauabschnitt BA2B, Abschluss Ende Mai 2022

Aktueller Stand

Derzeit werden die Straßenbauarbeiten auf der südlichen Seite der Stuttgarter Straße durchgeführt. In Fahrtrichtung Kirchheim ist eine Spur der Stuttgarter Straße befahrbar. In Fahrtrichtung Wendlingen wurde eine Umleitung über die Fabrikstraße, die Haldenstraße und die Isolde-Kurz-Straße eingerichtet. Die Arbeiten auf der südlichen Seite der Stuttgarter Straße sind bis Ende 2021 abgeschlossen. Der nördliche Bauabschnitt beginnt im Januar 2022. Parallel werden die Arbeiten im Bereich der Silbernen Rose durchgeführt. Hier ist eine Fertigstellung im Jahr 2021 nicht möglich, die Fertigstellung verzögert sich je nach Witterung bis Ende Januar 2021. Die hat keinen Einfluss auf den restlichen Bauablauf.

Nächster Schritt Gemeinderat


Die Maßnahme wird in der Verwaltung abgewickelt und der Gemeinderat über diesen Bericht regelmäßig über den Stand der Maßnahme informiert.

Handlungsbedarf

Kein Handlungsbedarf

Ablauf

ANFANG		2021												2022					
ENDE		2021												2022					
PSP	NAME	Jan	Feb	Mär	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mär	Apr	May	Jun
1																			
1.1.7	Bereich Laternsäule																		
1.1.2	Bereich Apotheke																		
1.1.3	Bereich Silberne Rose																		
1.1.4	Bereich Städtgärten Straße																		
1.1.5	Bereich Kreissparkasse																		
1.1.6	Baumaßnahmen fertiggestellt																		

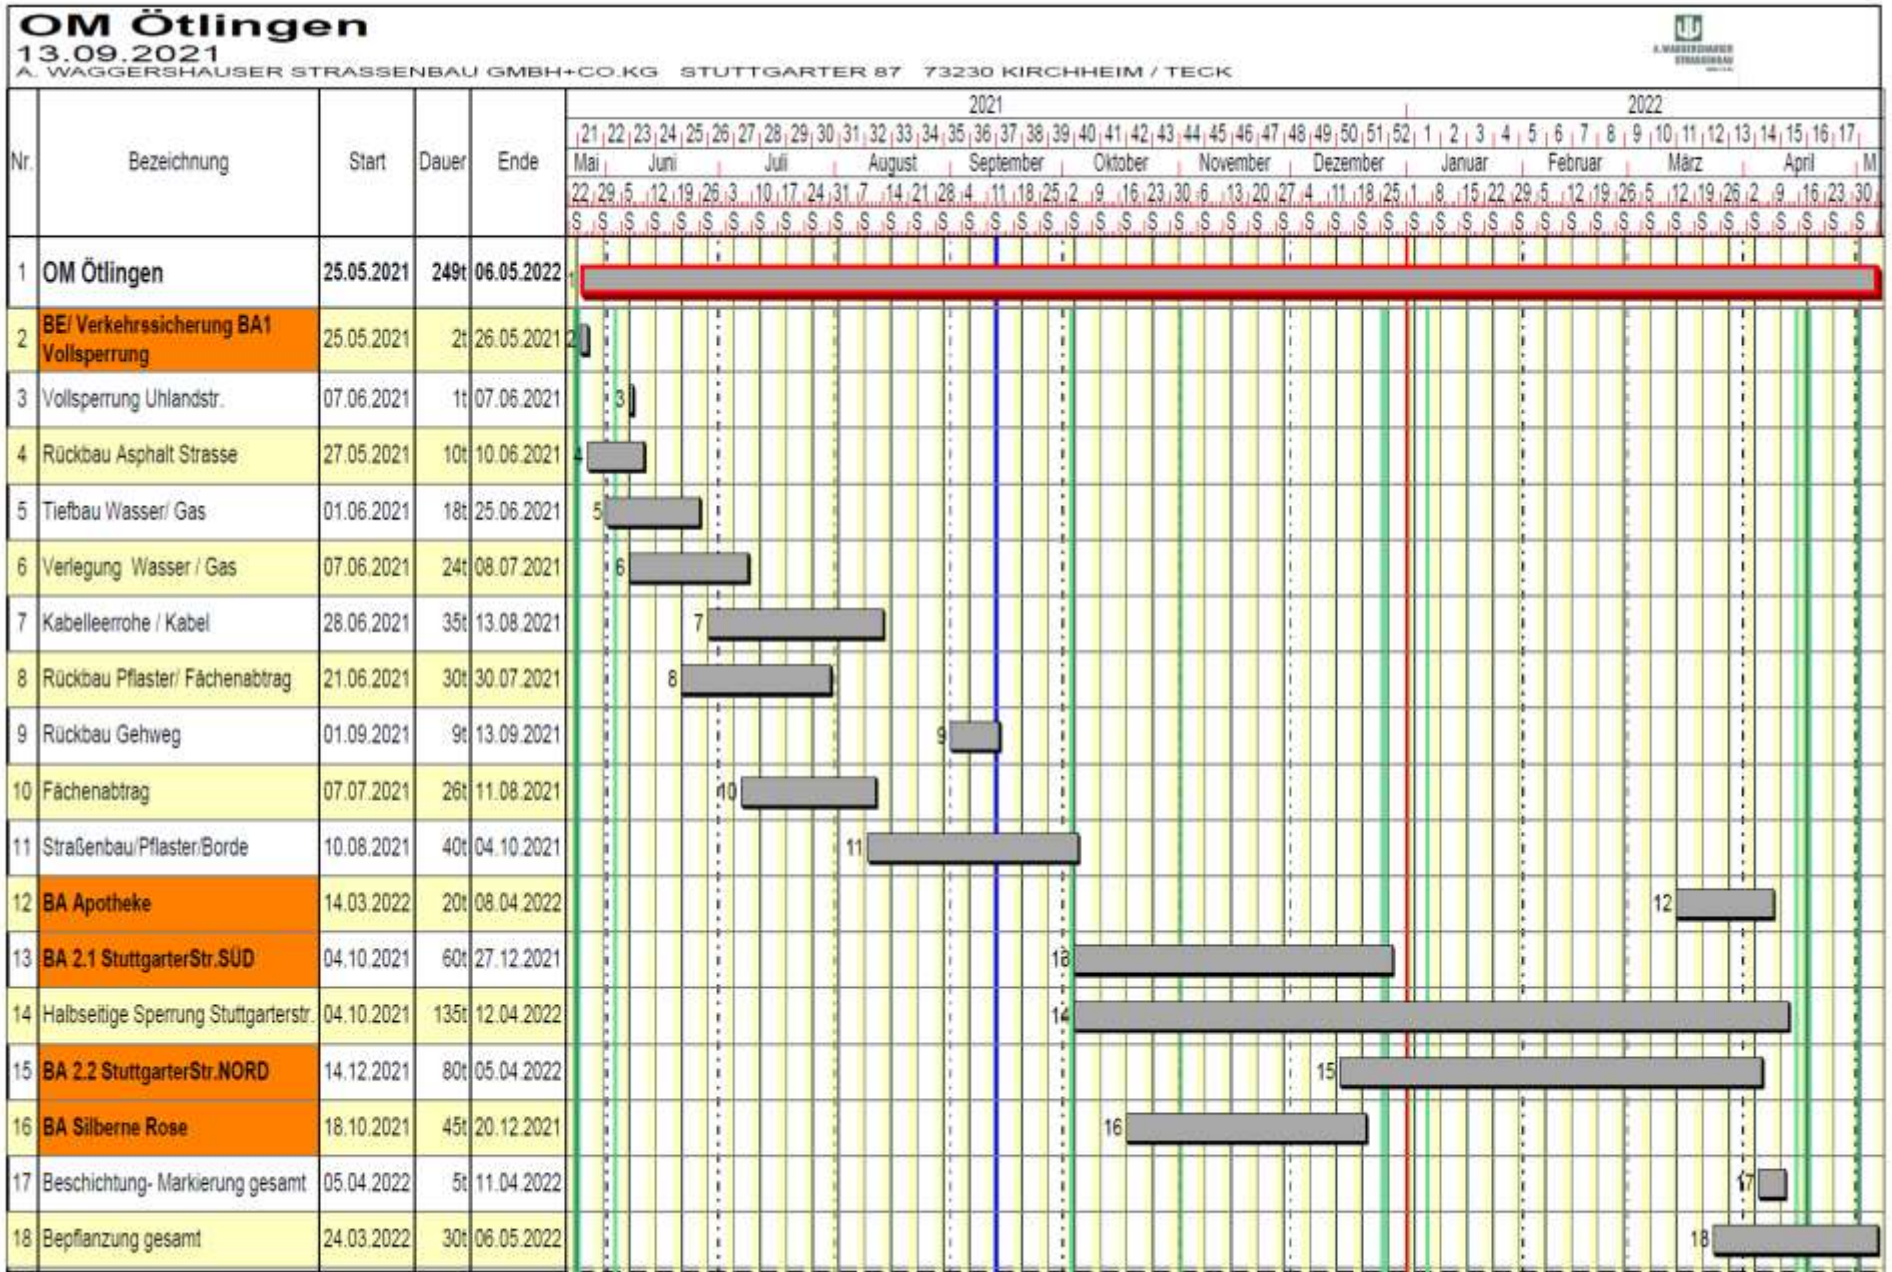

Gesamtkosten

