

INVESTITIONSBERICHT ZUM 21.01.2022

Anlage zu § 7 ö

ORTSMITTE ÖTLINGEN – KREUZUNG RATHAUS ÖTLINGEN BIS ZU WIELANDSTRAÙE (BA 2B)



Anlass	Aufwertung Ortsmitte Ötlingen Sanierungsgebiet mit Förderung
Zielsetzung	Sanierung und Ertüchtigung der alten Ver- und Entsorgungsleitungen sowie der Straße inkl. Platzgestaltung der Bereiche Laterale und Silberne Rose (jeweils südlich der Stuttgarter Straße) sowie Verlegung von Breitband
Projektleitung	Matthias Eisenschmid (SG Tiefbau und Beiträge)
Projektlaufzeit	Bauabschnitt BA2B, Abschluss Ende Mai 2022

Aktueller Stand

Die Arbeiten werden in KW 3 im nördlichen Bauabschnitt fortgesetzt. Die Asphaltdeckschicht im südlichen Abschnitt konnte aufgrund der zu niedrigen Temperaturen nicht eingebaut werden. Der Einbau soll im Zuge der Fertigstellung im Mai erfolgen. Eine Verzögerung der gesamten Bauzeit wird es dadurch nicht geben. In Fahrtrichtung Kirchheim ist eine Spur der Stuttgarter Straße befahrbar. In Fahrtrichtung Wendlingen wurde eine Umleitung über die Fabrikstraße, die Haldenstraße und die Isolde-Kurz-Straße eingerichtet. Parallel werden die Arbeiten im Bereich der Silbernen Rose durchgeführt, die Fertigstellung verzögert sich je nach Witterung bis Ende Januar 2022/Mitte Februar 2022. Dies hat keinen Einfluss auf den restlichen Bauablauf.

Nächster Schritt Gemeinderat


Die Maßnahme wird in der Verwaltung abgewickelt und der Gemeinderat über diesen Bericht regelmäßig über den Stand der Maßnahme informiert.

Handlungsbedarf

Kein Handlungsbedarf

Ablauf

ANFANG	07.06.2021	2021										2022					
ENDE	31.05.2022																
PSP	NAME	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun		
1																	
1.1.1	<i>Bereich Laterale</i>	◆															
1.1.2	<i>Bereich Apotheke</i>					◆											
1.1.3	<i>Bereich Silberne Rose</i>					◆											
1.1.4	<i>Bereich Stuttgarter Straße</i>						◆										
1.1.5	<i>Bereich Kreissparkasse</i>												◆				
1.1.6	<i>Baumaßnahmen fertiggestellt</i>														◆		

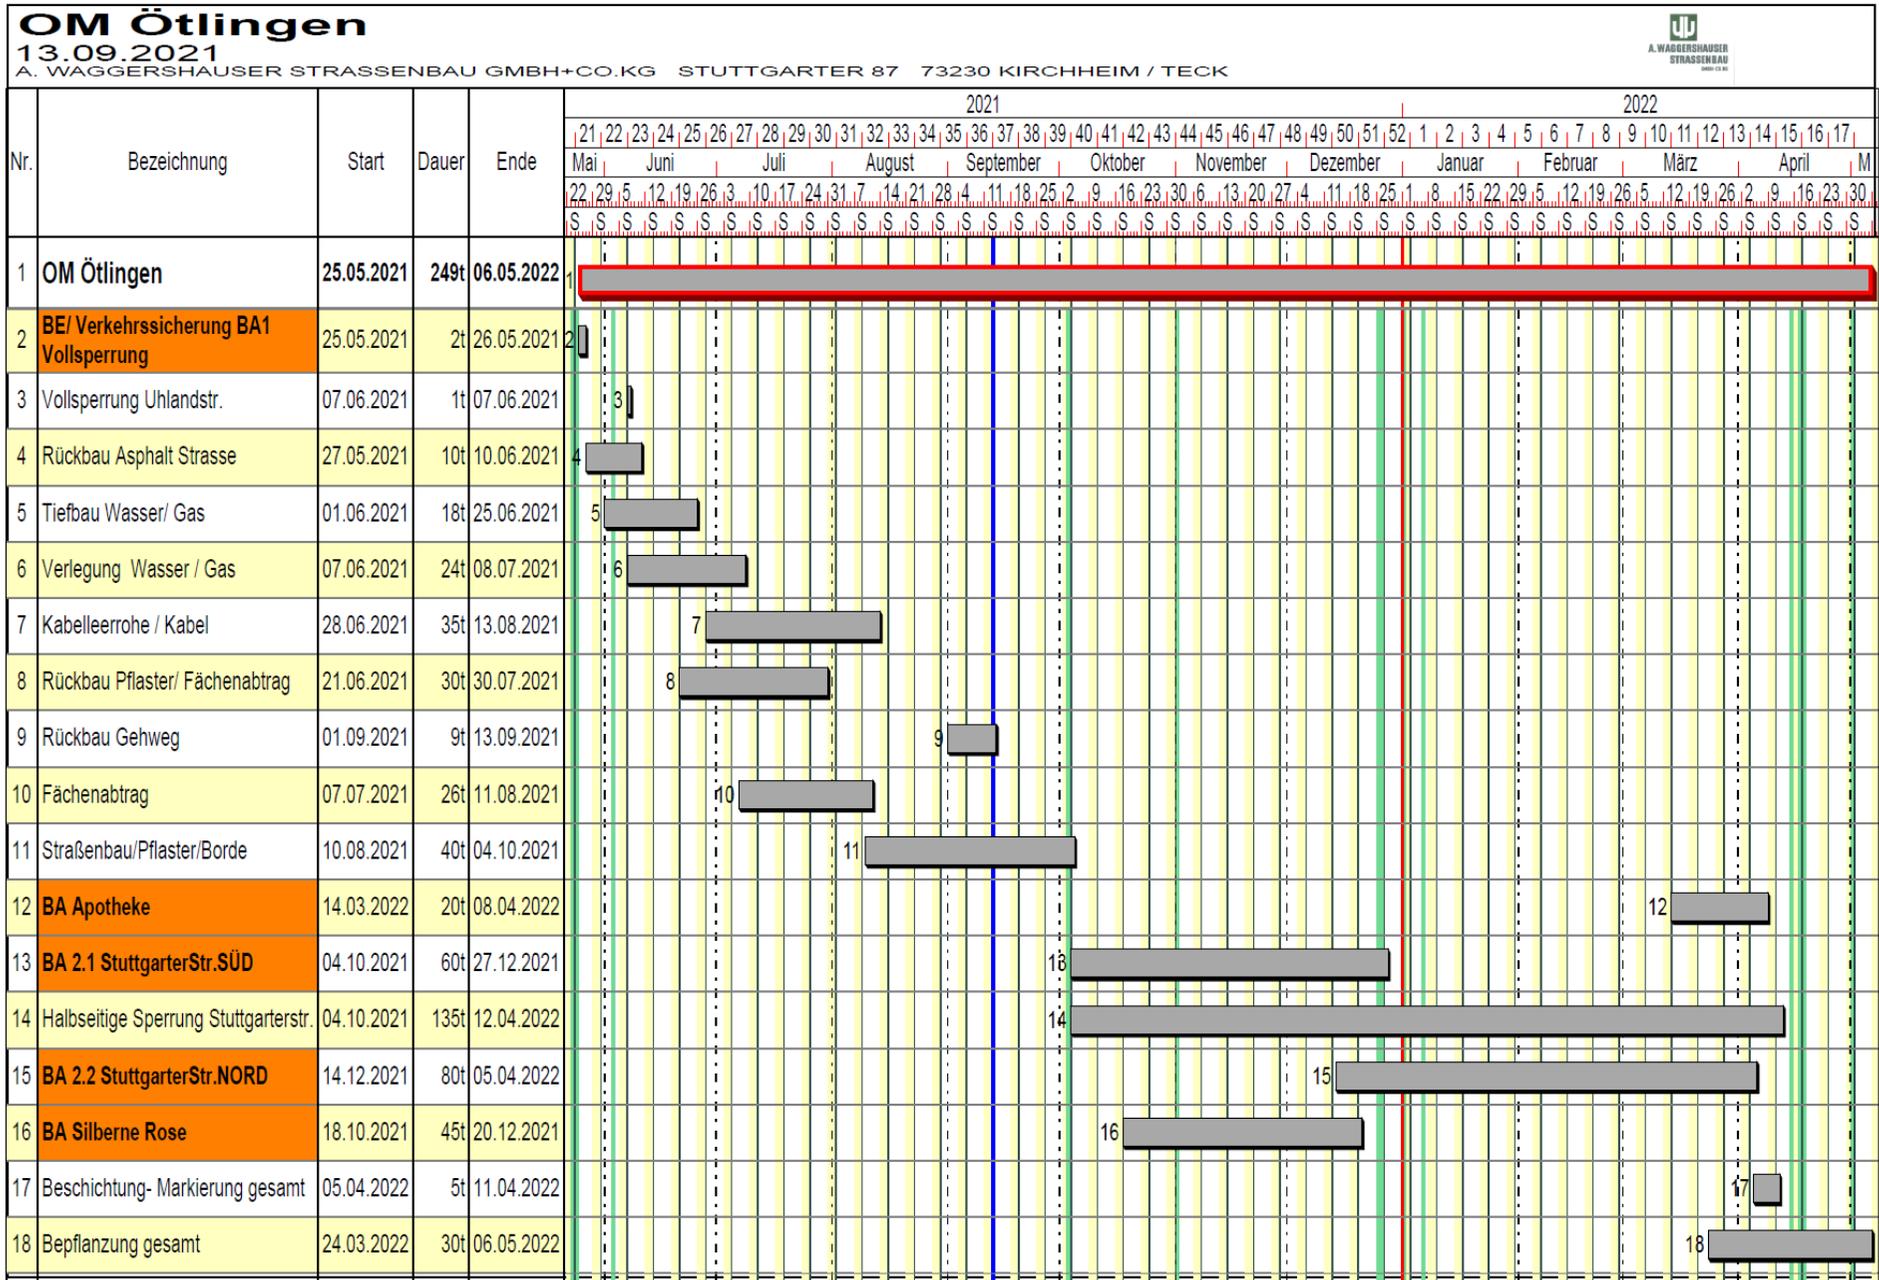

Gesamtkosten

