Projektnummer: 1825

Bauzeitenplan

Modernisierung Technisches Zentrum

VORABZUG

Pos	Vorgang	Start	Ende	Dauer
1	GEMEINDERATSSITZUNG - BESCHLUSS UND WEITERE PLANUNG	Mi, 11.11.20	Mi, 11.11.20	
2	GENEHMIGUNGSPLANUNG KLE / FACHPLANER ABGABE BAUANTRAG	Do, 12.11.20	Fr, 18.12.20	27at
3	BAUGENEHMIGUNG	Mi, 31.03.21	Mi, 31.03.21	
4	WERKPLANUNG NACH BAUABSCHNITTEN	Mo, 11.01.21	Do, 30.09.21	184at
5	AUSSCHREIBUNG / PRÜFUNG / VERGABE	Mo, 07.06.21	Fr, 29.04.22	231at
6	VORBEREITENDE MASSNAHMEN - AUSRÄUMEN DER MATERIALIEN, AUSZUG DER MIETER AUS DEN WOHNUNGEN	Mo, 28.06.21	Fr, 17.12.21	124at
7	**175 JAHRE FREIWILLIGE FEUERWEHR KIRCHHEIM**	Mo, 03.06.24	Fr, 28.06.24	
8	BAUABLAUF	Mo, 30.08.21	Fr, 20.12.24	1209kt
8.1	1.BAUABSCHNITT - KALTHALLE + INTERIMSMASSNAHMEN	Mo, 30.08.21	Fr, 08.04.22	158at
8.1.1	1. Kalthalle	Mo, 30.08.21	Fr, 18.03.22	143at
8.1.2	2. Umbau Tafelladen für Duschen / Umkleiden + Bereitstellung während Sanierung UG-Duschen	Mo, 10.01.22	Fr, 18.03.22	50at
8.1.3	3. Umzug Mobiliar aus UG/EG und Fahrzeughalle West in Kalthalle	Mo, 07.03.22	Fr, 08.04.22	25at
8.1.4	4. Einrichtung Interimsleitzentrale	Mo, 07.03.22	Fr, 08.04.22	25at
8.1.5	5. Einrichtung Interimsumkleiden in Fahrzeughalle West+Kalthalle	Mo, 07.03.22	Fr, 08.04.22	25at
8.1.6	6. Aufstellen einer Zelthalle für FW-Farhzeuge + Vorhalten für Sanierung der Fahrzeughalle	Mo, 07.03.22	Fr, 08.04.22	25at
8.2	2.BAUABSCHNITT - UG + EG OST	Mo, 11.04.22	Fr, 03.03.23	226at
8.2.1	1. Sanierung Untergeschoss - Ostflügel - einschließlich Sanitärbereich, Florianstüble, Technik	Mo, 11.04.22	Fr, 03.03.23	226at
8.2.2	2. Sanierung Erdgeschoss Ostflügel - einschließlich Leitzentrale, Fahrzeughalle und Umkleiden	Mo, 11.04.22	Fr, 03.03.23	226at
8.3	3.BAUABSCHNITT - UG + EG WEST	Mo, 06.03.23	Fr, 22.12.23	202at
8.3.1	1. Abbau Interims-Leitzentrale, Umzug Umkleiden	Mo, 06.03.23	Fr, 10.03.23	5at
8.3.2	2. Sanierung Untergeschoss - Westflügel - einschließlich Umkleiden Jungen/Mädchen	Mo, 06.03.23	Fr, 22.12.23	202at
8.3.3	3. Sanierung Erdgeschoss - Westflügel - einschließlich Bürobereich FW / Eingangs-bereich /WC-Bereich	Mo, 06.03.23	Fr, 22.12.23	202at
8.3.4	4. Atemschutzwerkstatt	Mo, 19.06.23	Fr, 22.12.23	133at
8.4	4.BAUABSCHNITT 1. OBERGESCHOSS	Mo, 30.10.23	Fr, 17.05.24	137at
8.4.1	1. Sanierung WC-Bereich/Flur	Mo, 30.10.23	Fr, 02.02.24	66at
8.4.2	2. Jugendfeuerwehrraum	Mo, 05.02.24	Fr, 17.05.24	71at
8.4.3	3. Schulungsraum	Mo, 05.02.24	Fr, 17.05.24	71at
8.4.4	4. Bürobereich inkl. Funkwerkstatt	Mo, 05.02.24	Fr, 17.05.24	71at
8.5	5.BAUABSCHNITT AUSSENANLAGE	Mo, 30.08.21	Fr, 17.05.24	992kt
8.5.1	Außenanlage	Mo, 30.08.21	Fr, 17.05.24	
8.6	6.BAUABSCHNITT ENERGETISCHE FASSADENSANIERUNG	Mo, 11.04.22	Fr, 17.05.24	768kt
8.6.1	Fassade FW-Bereich + Wohnungen	Mo, 11.04.22	Fr, 17.05.24	
8.7	7.BAUABSCHNITT WOHNUNGEN + DACH	Mo, 11.04.22	Fr, 20.12.24	985kt
8.7.1	Sanierung Wohnungen + Dach	Mo, 11.04.22	Fr, 20.12.24	

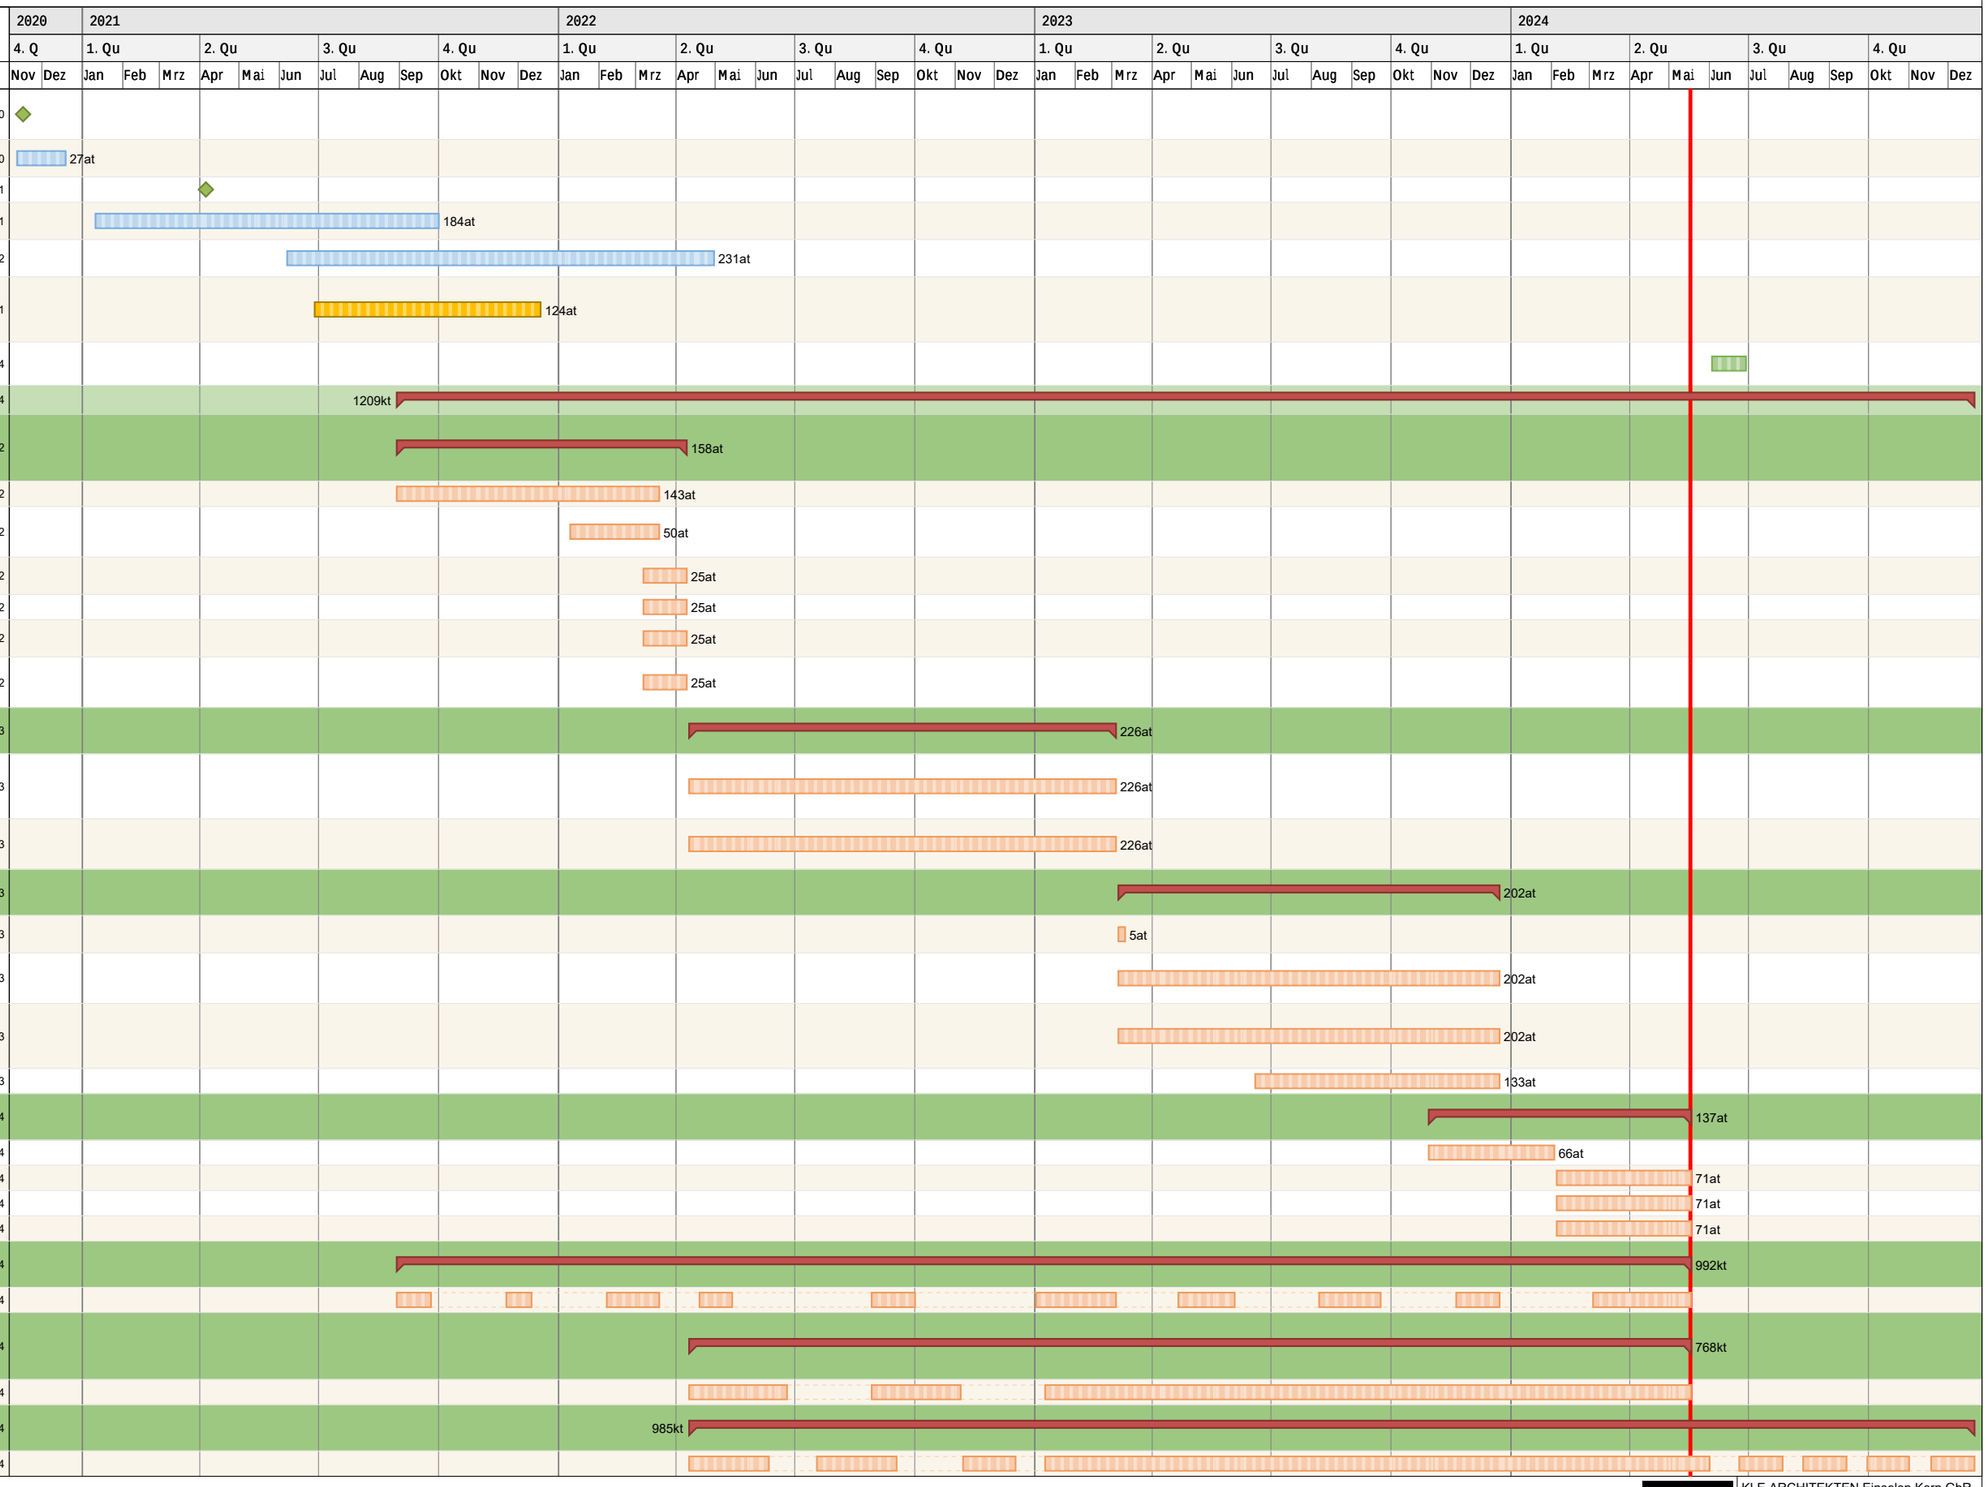

erstellt mit pro-Plan (17.0.0.25) Lizenz für KLE ARCHITEKTEN Einselen Kern GbR, Kirchheim unter Teck

Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 24.11.2020 15:56
Bearbeiter: dietrich

Terminplanung in Abhängigkeit von Baugenehmigung/Baufreigabe/Auftragsvergaben

KLE ARCHITEKTEN Einselen Kern GbR
Steingaustraße 2
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tel. +49 7021 9751 0
Fax +49 7021 9751 50
e-Mail: info@kle-architekten.de
