
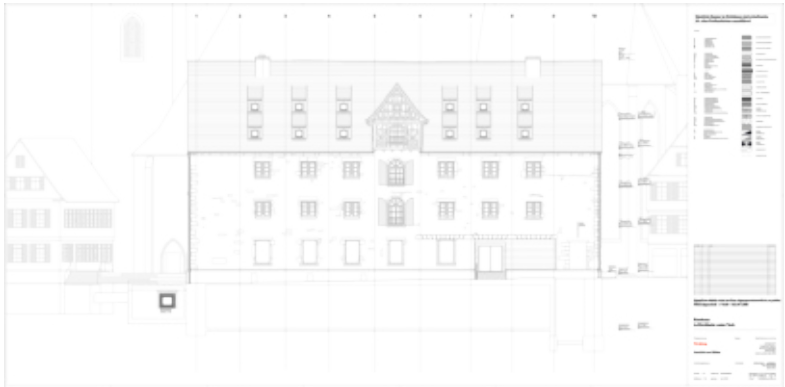


Projekt: Kornhaus Kirchheim

**Änderungsantrag Nr. 02 „Lüftungsbauwerk / 2. Kaminbauwerk“**

<b>Projektänderung</b>	
Antragsteller (Architekt/ Fachplaner)	Cheret&Bozic Architekten
Beschreibung ursprüngliche Planung	Umrüsten der Gauben im Bereich Achse 7-8 (4 Stück) als Lüftungsauslässe. 
Beschreibung der Änderung	Schaffung eines Kaminbauwerks im Bereich Achse 7-8 analog zum bereits vorgesehenen Kaminbauwerk Achse 2-3 zur Aufnahme der Zu- und Abluftöffnungen der Lüftungszentrale im 2. DG. Verzicht auf Vergrößerung und Umrüstung der Gauben im Bereich Achse 7-8 und Erhalt dieser als Fenster. 
Begründung und Veranlassung der Änderung	Die Geometrie im 2. DG zwischen dem bestehenden Dachtragwerk ist knapp bemessen zum Einbau einer Lüftungsanlage. Um auf Ersatzmaßnahmen im Bestandtragwerk verzichten zu können und die Gauben in diesem Bereich nicht vergrößern zu müssen, ist die neu geplante Zu- und Fortluftplanung über ein Kaminbauwerk nötig.
Vorschlag zur Kompensation der Änderung	-
Planung abgestimmt mit	Landesamt für Denkmalpflege,

## Änderungsantrag Nr. 02 „Lüftungsbauwerk / 2. Kaminbauwerk“

	Bauherrenvertretung
--	---------------------

Auswirkung der Änderung auf die Kosten		
Auswirkung auf Kosten	<input type="checkbox"/> ja (Nachtragserstellung notwendig)	<input checked="" type="checkbox"/> nein

Kostenberechnung			
Kostengruppen		Mehrkosten € brutto	Einsparpotential € brutto
200	Herrichten und Erschließung	€	€
300	Baukonstruktion	€	€
400	Technische Anlagen	€	€
500	Außenanlagen	€	€
600	Ausstattung	€	€
700	Baunebenkosten	€	€
	<b>Summe:</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>Änderungskosten gesamt:</b>	<b>€</b>	
	<b>Deckung:</b>	<b>Innerhalb der Projektkosten</b>	

Auswirkung der Änderung auf Termine		
Aktuell gültiger Terminplan		
Auswirkung auf Vertragstermine	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Terminabschätzung		
Auswirkung auf vertraglich vereinbarte Zwischentermine		
Auswirkungen auf vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermine		

Projekt: Kornhaus Kirchheim

## Änderungsantrag Nr. 02 „Lüftungsbauwerk / 2. Kaminbauwerk“

Beschleunigungsmaßnahmen möglich	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Antrag auf Genehmigung der Änderung	
Antrag ist zu genehmigen bis	20.10.2021
Begründung	Die Ausführungsplanung ist fast fertiggestellt.
Auswirkung bei Ablehnung	Umplanungskosten
Aufgestellt	Datum                      Unterschrift

## Änderungsantrag Nr. 02 „Lüftungsbauwerk / 2. Kaminbauwerk“

---

<b>Prüfung Projektleitung Bauherrenvertretung</b>	
Stellungnahme	
Geprüft und zur Genehmigung empfohlen	Datum                      Unterschrift

<b>Genehmigung</b>	
Genehmigt Sachgebietsleitung	Datum                      Unterschrift
Genehmigt Abteilungsleitung	Datum                      Unterschrift
Genehmigt Dezernent	Datum                      Unterschrift
