Freibad Kirchheim Teck | Maßnahme Erweiterung Technikgebäude | Rahmenterminplan | 4a Architekten GmbH, 10.09.2020 | Index 01
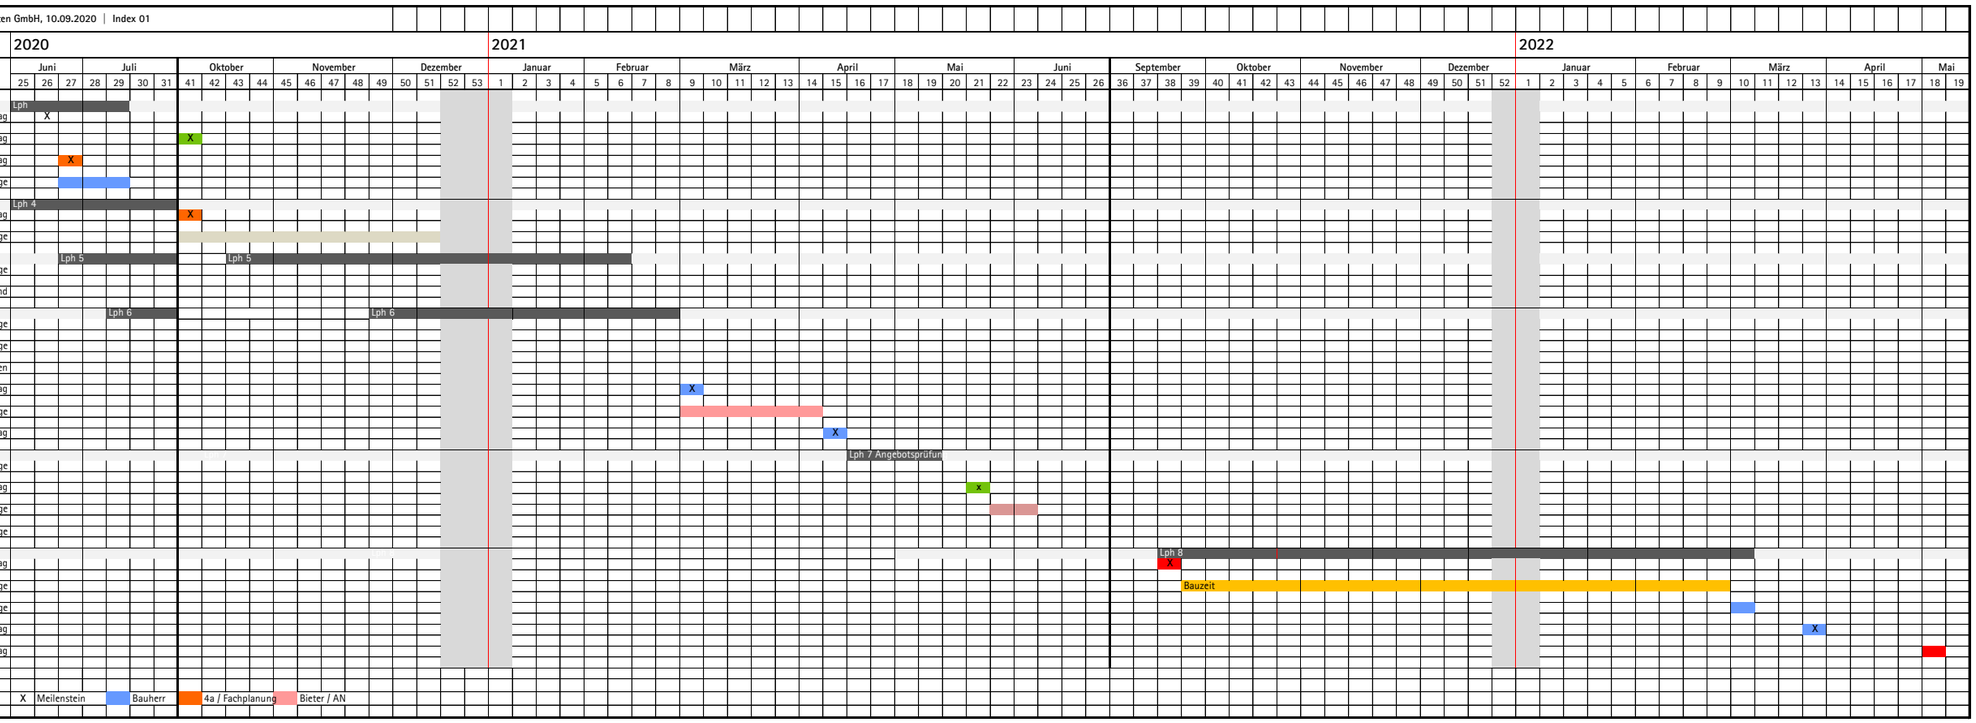
Nr.	Vorgangsname	Zuständigkeit	Anfang	Ende	Dauer
1	**Leistungsphase 3: Entwurfsplanung** Abgabe Kosten + Terminplanung	4a / Fachplanung	24.06.2020	24.06.2020	1 Tag
2	Gemeinderatssitzung: Baubeschluss	Gemeinderat	XX.XX.2020		1 Tag
3	Abgabe Entwurfsplanung	4a / Fachplanung	30.06.2020	30.06.2020	1 Tag
4	Prüfung und Freigabe durch Bauherren	Bauherr	01.07.2020	15.07.2020	14 Tage
5	**Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung** Abgabe Genehmigungsplanung / Bauantrag	4a	05.10.2020	05.10.2020	1 Tag
6	Prüfung + Freigabe durch Baurechtsbehörde	Baurechtsamt	05.10.2020	21.12.2020	61 Tage
7	**Leistungsphase 5: Ausführungsplanung** Werk- und Detailplanung	4a / Fachplanung	29.06.2020	16.08.2020	48 Tage
8	Prüfung + Freigabe Werkstattplanung Firmen	4a			Baubegleitend
9	**Leistungsphase 6: Vorbereitung der** Erstellung GU-LV (Beschränktes Vergabeverfa	4a / Fachplanung	13.07.2020	30.08.2020	48 Tage
10	Prüfung GU-LV	Bauherr	31.08.2020	13.09.2020	13 Tage
	Vorgeschalteter Teilnahmewettbewerb?	Bauherr			12 Wochen
11	Versand GU-LV	Bauherr	14.09.2020	14.09.2020	1 Tag
12	Angebotsphase	Bieter	15.09.2020	13.10.2020	28 Tage
13	Submission	Bauherr	14.10.2020	14.10.2020	1 Tag
14	**Leistungsphase 7: Vergabe** Angebotsprüfung	4a, Fachplaner	15.10.2020	01.11.2020	17 Tage
15	Gemeinderatssitzung: Ermächtigung zur Verg	Gemeinderat	XX.XX.2020		1 Tag
16	Einspruchsfrist Firmen	AN	05.11.2020	15.11.2020	10 Tage
17	Arbeitsvorbereitung	AN	16.11.2020	29.11.2020	14 Tage
18	**Leistungsphase 8: Objektüberwachung** Baubeginn	4a / Fachplanung	30.11.2020	30.11.2020	1 Tag
19	Bauzeit	4a / Fachplanung	30.11.2020	18.04.2021	118 Tage
20	Inbetriebnahme	Bauherr	19.04.2021	25.04.2021	7 Tage
21	Fertigstellung	Bauherr	26.04.2021	26.04.2021	1 Tag
22	Eröffnung Freibad	Bauherr	01.05.2021	01.05.2021	1 Tag
